

**ČESKÁ TŘEBOVÁ - OBNOVA VODOVODNÍHO ŘADU
- SILNICE I/14 - UL. RIEGEROVA I.
- ÚSEK UL. SMETANOVA - UL. NA SPLAVĚ
K.Ú. ČESKÁ TŘEBOVÁ**

**F. Zásady organizace výstavby
F.1 Technická zpráva**

Název akce:

**ČESKÁ TŘEBOVÁ - OBNOVA VODOVODNÍHO ŘADU
- SILNICE I/14 - UL. RIEGEROVA I.
- ÚSEK UL. SMETANOVA - UL. NA SPLAVĚ
K.Ú. ČESKÁ TŘEBOVÁ**

Řešitelská organizace:

**M Projekt CZ s.r.o.
17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 526 274
e-mail: mprojektcz@mprojektcz.cz
www.mprojektcz.cz
ID schránky: j2briir**

Projektant:

Bohumil Š T Ě P Á N E K, DiS.

**Odpovědný projektant:
Číslo autorizace ČKAIT:
Obor autorizace :**

**Ing. Miloš P O P E L Á Ř
IV00 0701003
stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství**

Spolupracovníci:

**Ing. Markéta P O P E L Á Ř O V Á
Lubica H Á J K O V Á**

Ředitel společnosti:

Ing. Miloš P O P E L Á Ř

OBSAH :

F.	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY.....	5
F.1.A.	IDENTIFIKACE STAVBY	5
F.1.B.	INFORMACE O ROZSAHU STAVENIŠTĚ, ÚPRAVY STAVENIŠTĚ,	
	OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY	
	NA STAVENIŠTĚ	7
F.1.B.1.	ROZSAH STAVENIŠTĚ	7
F.1.B.2.	OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ	8
F.1.B.3.	TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE	8
F.1.B.4.	PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ	9
F.1.B.5.	VZOROVÁ SCHÉMATA PRO PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU	
	NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH	11
F.1.C.	VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	18
F.1.D.	NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY,	
	ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ.....	19
F.1.E.	ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH	
	OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU	
	SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	19
F.1.F.	USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY	
	VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ	20
F.1.G.	ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH	
	A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ	20
F.1.H.	POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ	20
F.1.I.	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI	
	A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ	
	PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH	
	PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	21
F.1.J.	PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ.....	22
F.1.J.1.	OCHRANA PROTI HLUKU, VIBRAČÍM A EMISÍM.....	22
F.1.J.2.	OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD	24
F.1.J.3.	NEBEZPEČNÉ LÁTKY	24
F.1.K.	ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH	
	TERMÍNŮ.....	24

SEZNAM PŘÍLOH VÝKRESOVÉ ČÁSTI:

F.2.	SITUACE STAVBY NAD KM – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
------	--

F. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

F.1.A. IDENTIFIKACE STAVBY

název stavby	ČESKÁ TŘEBOVÁ - OBNOVA VODOVODNÍHO ŘADU - SILNICE I/14 - UL. RIEGEROVA I. - ÚSEK UL. SMETANOVA - UL. NA SPLAVĚ K.Ú. ČESKÁ TŘEBOVÁ
zakázkové číslo:	2021_1014
místo stavby:	Česká Třebová, ul. Riegerova úsek ul. Smetanova – ul. Na Splavě
kraj:	CZ053 - Pardubický kraj
okres:	CZ0534 - okres Ústí nad Orlicí
katastrální území:	Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí);62175
předmět projektové dokumentace:	nová stavba trvalá stavba vodovod projektová dokumentace pro provádění stavby
stavebník:	Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o. Kozlovská 1733 560 02 Česká Třebová IČO: 60108118 zastoupený : panem Markem Novotným, jednatelem
objednatel:	Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o. Kozlovská 1733 560 02 Česká Třebová IČO: 60108118 zastoupený : panem Markem Novotným, jednatelem
Zpracovatel PD:	M Projekt CZ s.r.o. 17. listopadu 1020 562 01 Ústí nad Orlicí IČO: 03508544, DIČ: CZ03508544 tel.: +420 465 526 274 e-mail: mprojektcz@mprojektcz.cz www.mprojektcz.cz ID schránky: j2briir
Datum zpracování:	březen 2021

Na základě objednávky se stala společnost M Projekt CZ s.r.o. Ústí nad Orlicí zhotovitelem projektové dokumentace na akci „**ČESKÁ TŘEBOVÁ - OBNOVA VODOVODNÍHO ŘADU - SILNICE I / 14 - UL. RIEGEROVA I - ÚSEK UL. SMETANOVA - UL. NA SPLAVĚ, K.Ú. ČESKÁ TŘEBOVÁ**“.

V tomto stupni se jedná o vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby.

Navrhovanými stavebními objekty bude řešena obnova stávajícího vodovodu v lokalitě ul. Riegerova (v úseku ul. Smetanova – ul. Na Splavě) včetně přepojení domovních vodovodních přípojek.

Stav. Objekt	Ozn.	VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 100RC2 PN16 SDR11 160/14,6 DN 130,8 mm
SO - 01	ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD RIE-1	136
Celková délka potrubí v m :		136

Stav. objekt	Číslo popisné/číslo evidenční	VODOVODNÍ POTRUBÍ PE100 RC2 PN16 SDR 11 32/3,0 DN 26 (veřejná část)	VODOVODNÍ POTRUBÍ PE100 RC2 PN16 SDR 11 63/5,8 DN 51,4	VODOVODNÍ POTRUBÍ PE100 RC2 PN16 SDR 11 110/10 DN 90
SO - 01 - 01	č.p. 274	5		
SO - 01 - 02	č.p. 189	13		
SO - 01 - 03	č.p. 283	12		
SO - 01 - 04	č.p. 5669	13		
SO - 01 - 05	"ke garážím"	14		
SO - 01 - 06	č.p. 495	15		
SO - 01 - 07	Propojení řadů		2	
SO - 01 - 08	Propojení řadů		11	
SO - 01 - 09	Propojení řadů			1
Celková délka potrubí dle druhu materiálu v m :		72	13	1
Celková délka potrubí v m :		86		

F.1.B. INFORMACE O ROZSAHU STAVENIŠTĚ, ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ

F.1.B.1. ROZSAH STAVENIŠTĚ

Zájmové území se nachází v intravilánu. Zástavba rodinnými domy se zahradami je soustředěná podél komunikace.

Výkopové práce budou prováděny v pozemních komunikacích.

Stavba bude probíhat za úplné, případně částečné uzávěry komunikací.

Pokud bude v případě stísněných prostorových poměrů nutno uzavřít celou komunikaci, bude stanoven technologický postup umožňující průjezd záchranných zdravotnických a hasičských vozů. Staveniště dále budou tvořit i přilehlé chodníky, zelené pásy, případně přilehlé obecní pozemky podél trasy komunikace.

Dodavatel stavby bude soustavně zajišťovat průjezd pro pohotovostní vozidla záchranné služby a vozidla hasičů.

V místech, kde se výkopové rýhy přibližují k budovám a jiným konstrukcím (stožáry vedení NN, telefonu, traf apod.) je nutno provést zabezpečení stavební rýhy a ostatních konstrukcí tak, aby nedošlo k jejich poškození a ohrožení stability, tj. poškození zájmů dotčených organizací.

Podrobnější hranice staveniště jsou zakresleny ve výkresové příloze F.2 - SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZOV a budou podrobněji zpracovány v rámci inženýrské činnosti dodavatele stavby.

Stanovení rozsahu staveniště je odůvodněno vlastním rozsahem stavby a nejnútnejším okolím od ní pro bezpečnou a účelnou manipulaci stavebních strojů a pohyb pracovníků stavby.

ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ OZNÁMÍ ZHOTOVITEL STAVBY V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU VŠEM VLASTNÍKŮM DOTČENÝCH POZEMKŮ A POZEMKŮ, KTERÉ BUDOU PROVÁDĚNÍM STAVBY DOTČENY.

PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY S MAXIMÁLNĚ MOŽNOU OHLEDUPLNOSTÍ KE STROMOVÍ A KULTURÁM. PŘI ZŘÍZOVÁNÍ KOMUNIKACE BUDOU ŠETŘENA PRÁVA VLASTNÍKA PŘEDMĚTNÝCH POZEMKŮ.

SOUČASNĚ ZHOTOVITEL STAVBY ZDOKUMENTUJE FOTOGRAFIEMI A ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU SOUČASNÝ STAV POZEMKŮ A OKOLNÍCH NEMOVITOSTÍ TAK, ABY MĚL PODKLADY DO JAKÉHO STAVU MÁ BÝT POZEMEK UVEDEN PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ, RESP. ZDA K PŘÍPADNÝM ŠKODÁM DOŠLO PŘI NEBO PO REALIZACI STAVBY.

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE PROVEDENY SONDY PRO OVĚŘENÍ PRŮBĚHU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!

Všechny výše uvedené pozemky navržené k záboru zajišťuje stavebník / objednatel. Pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka / objednatele.

F.1.B.2. OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ

Požadavky na oplocení staveniště vyplývají mj. z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit,

b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k nařízení vlády,

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením,

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k nařízení vlády nebo zasypány.

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením.

Oplocení staveniště včetně vstupních bran bude zhotovitel stavby pravidelně kontrolovat a udržovat a bez prodlení opraví veškeré závady. Jednotlivým vlastníkům přilehlých pozemků bude dle potřeby umožněn přístup na dočasně oplocené staveniště. Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou ponechány na staveništi do té doby, dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou dokončeny, aby příslušná část staveniště byla trvale předána k užívání.

Zhotovitel stavby před zahájením stavebních prací vybuduje na příslušných plochách dočasné oplocení kolem stavebních, přístupových a skladovacích ploch a zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu výstavby. Dočasné oplocení bude splňovat požadavky všech zdravotních a bezpečnostních předpisů platných v ČR, zvláště s důrazem na bezpečnost osob na staveništi, viz Souhrnná technická zpráva.

F.1.B.3. TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE

Vzhledem k liniovému charakteru stavby se předpokládá provedení stavby po úsecích dle postupu realizace vodovodu. Při stavebních pracích v komunikacích musí zhotovitel odvážet vytěženou zeminu a živici, které nelze skladovat na vozovce. Živice bude odvážena k recyklaci. Odhrnutá ornice ze zatravněných ploch bude ukládána na mezideponie a určena k opětovnému použití

S trvalými deponiemi není uvažováno. Mezideponie bude řešena podél stavěných úseků vodovodu na pozemcích, které budou určeny v dalším stupni projektové dokumentace. Přebytečný výkopek bude ukládán na řízenou skládku

F.1.B.4. PŘÍJEZY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ

Požadavky na přístupy a příjezdy na staveniště vyplývají mj. z nařízení vlády č.591/2006 Sb.:

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.



P07 Přednost protijedoucích vozidel



B30 Zákaz vstupu chodců (do prostoru staveniště)



A15 Práce



A06b Zúžená vozovka (z jedné strany)



B1 Zákaz vjezdu všech vozidel



B24a Zákaz odbočování vpravo



B24b Zákaz odbočování vlevo



B20a Nejvyšší povolená rychlost



P8 Přednost před protijedoucími vozidly



Z02 Zábrana pro označení uzavírky



S1 Tříbarevná soustava s plnými signály



6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis.

7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.

Pro tuto stavbu není nutné budovat příjezdové komunikace. Staveniště bude přístupné po stávajících místních komunikacích, železniční stanice s možností překládky stavebních materiálů se nachází v České Třebové.

ZPRACOVATEL UPOZORŇUJE NA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ NA STAVENIŠTI, KDE BUDE ZACHOVÁN ČÁSTEČNÝ NEBO OMEZENÝ POHYB OBYVATEL DOTČENÝCH NEMOVITOSTÍ A VŽDY ZAJIŠTĚNA DOSTUPNOST NEMOVITOSTÍ VOZIDLY HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU, VOZIDEL RYCHLÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY A VOZIDEL PRO ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU.


PRO PŘÍJEZD DO PROSTORU STAVENIŠTĚ BUDOU VYUŽITY STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE.


ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE UPOZORŇUJE, ŽE STAVENIŠTĚ JE SE STÍŽENÝMI PROVOZNÍMI VLIVY. K DOTČENÝM NEMOVITOSTEM JE POUZE JEDINÝ PŘÍSTUP, KTERÝ MUSÍ BÝT V PRŮBĚHU VÝSTAVBY ZACHOVÁN.


F.1.B.5. VZOROVÁ SCHÉMATA PRO PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH


Označení pracovních míst v obci dle Technických podmínek TP 66/2015 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.


Uvedená vzorová schémata jsou stanovena jako schémata pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 61 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Znázorněný rozsah dopravního značení se přitom považuje za minimální. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je upraveno v § 77 a působnost ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a policie v § 124 tohoto zákona.

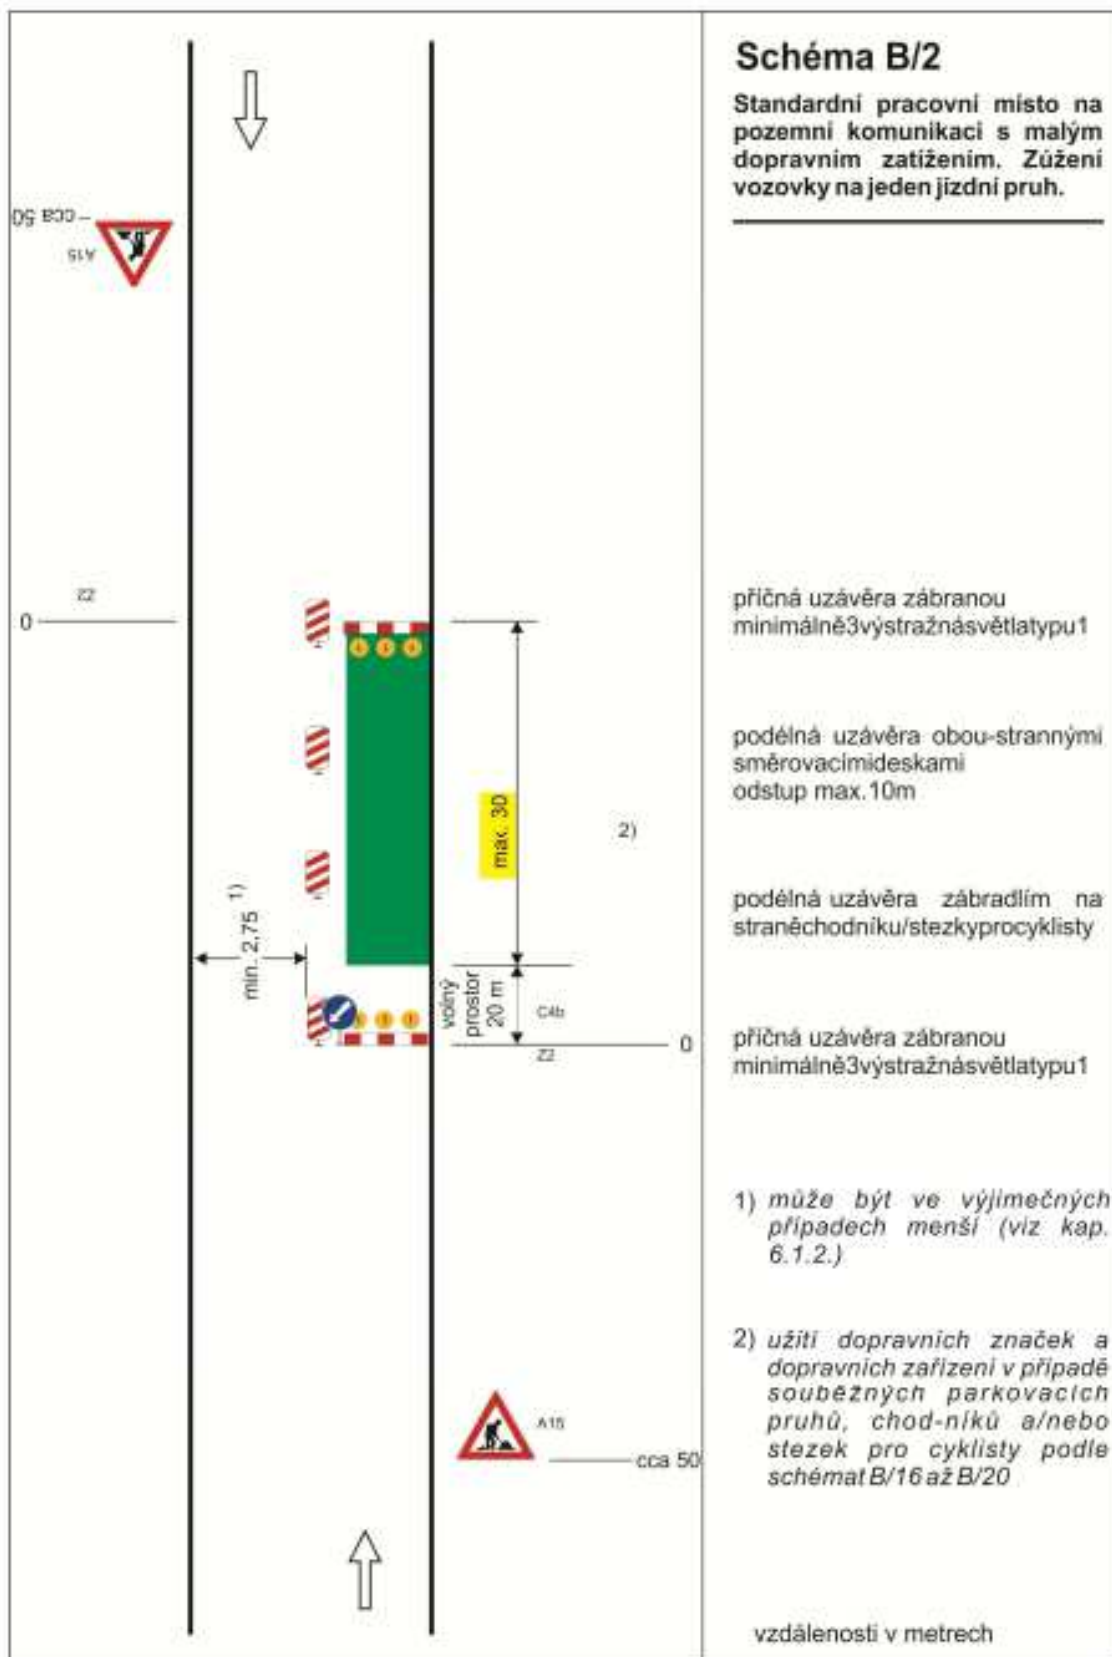

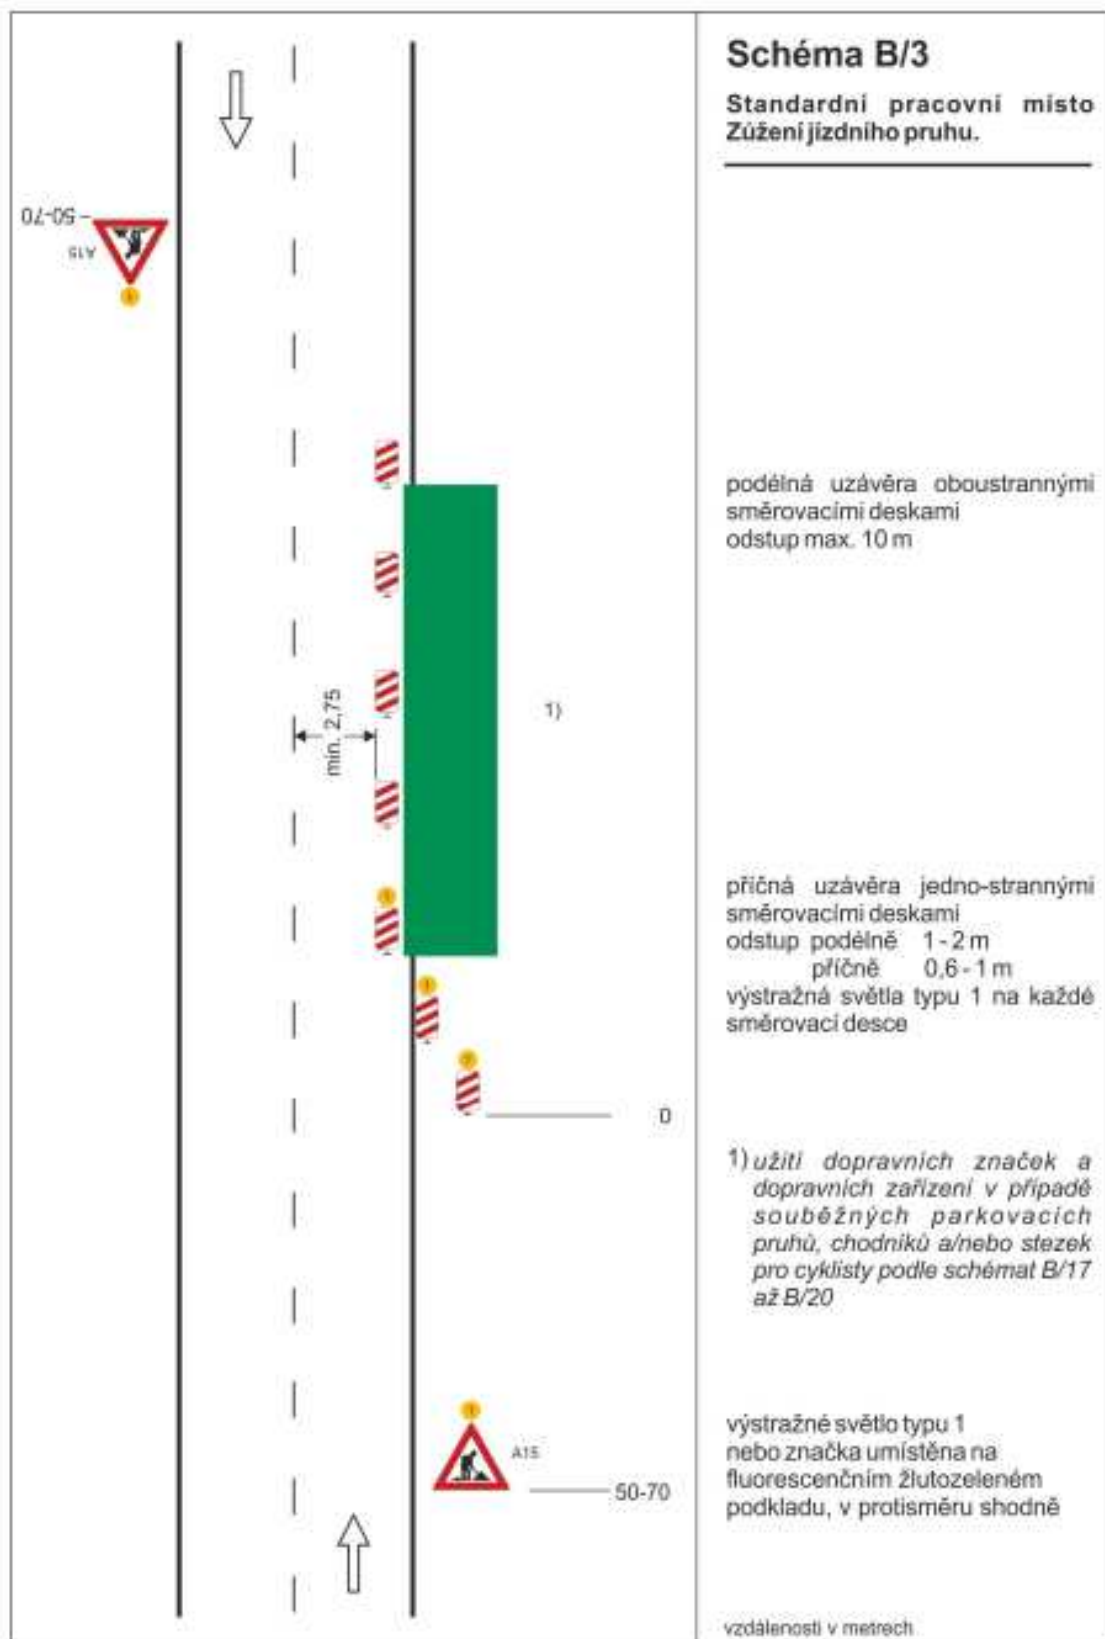

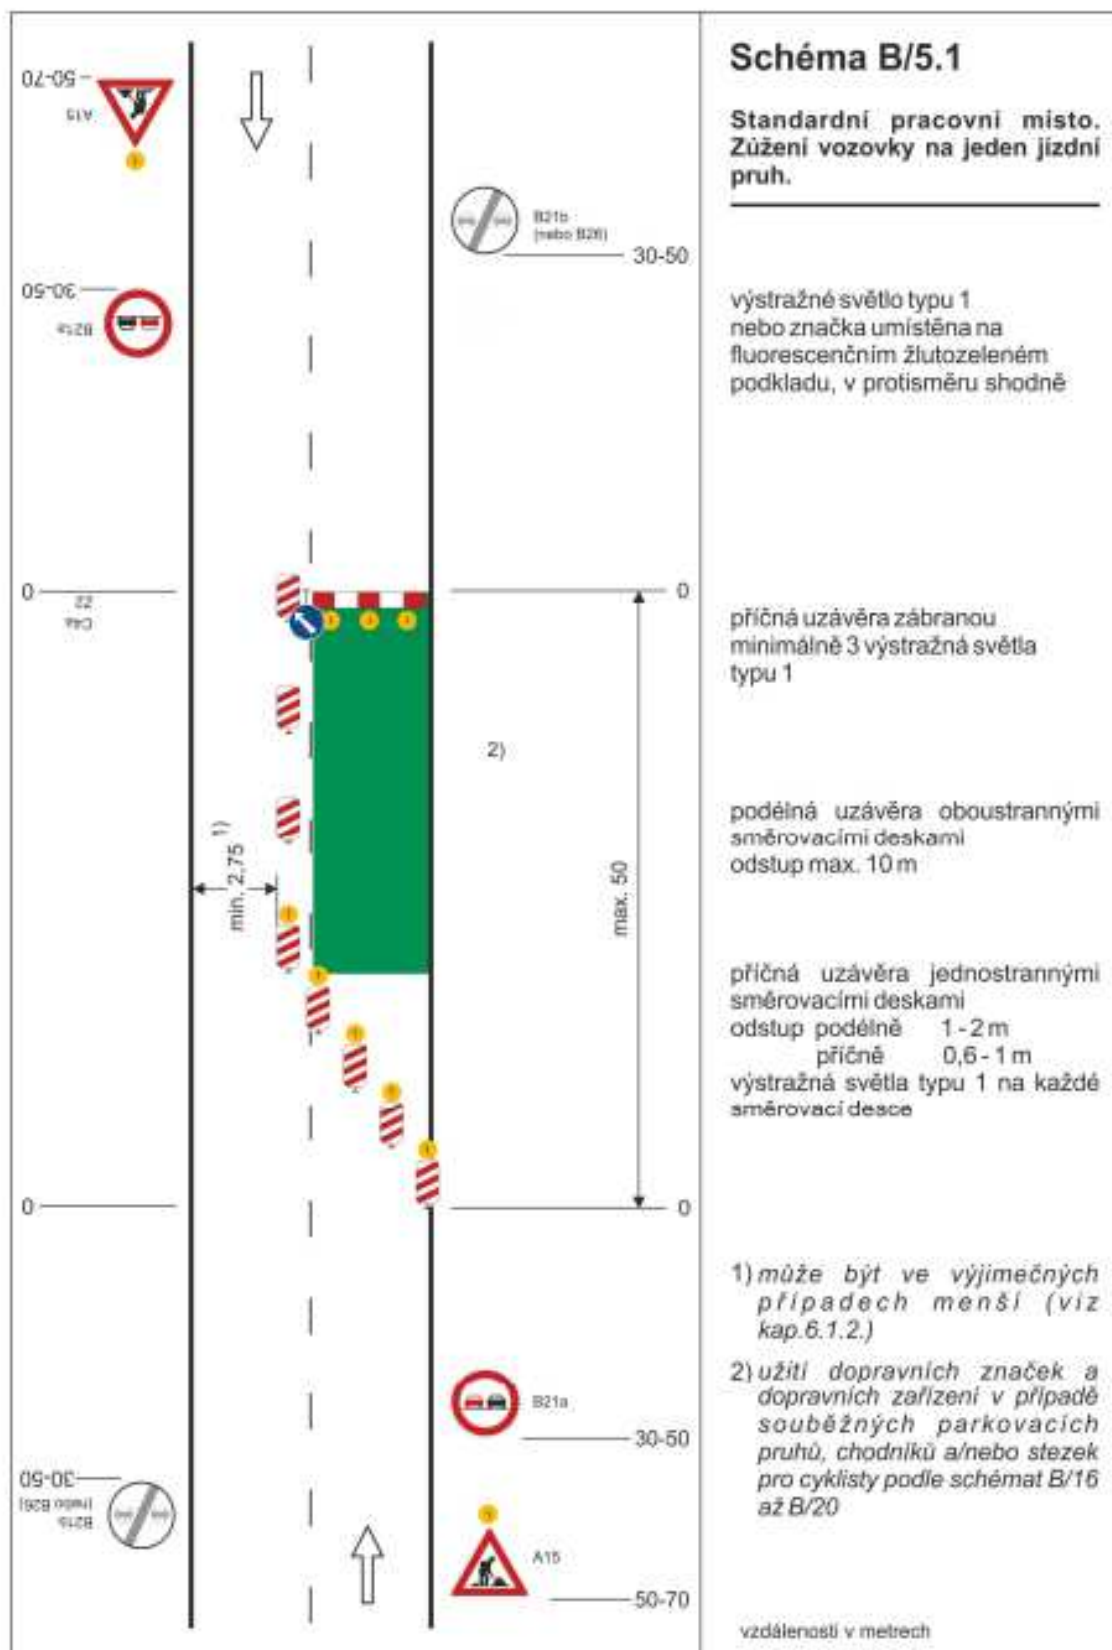

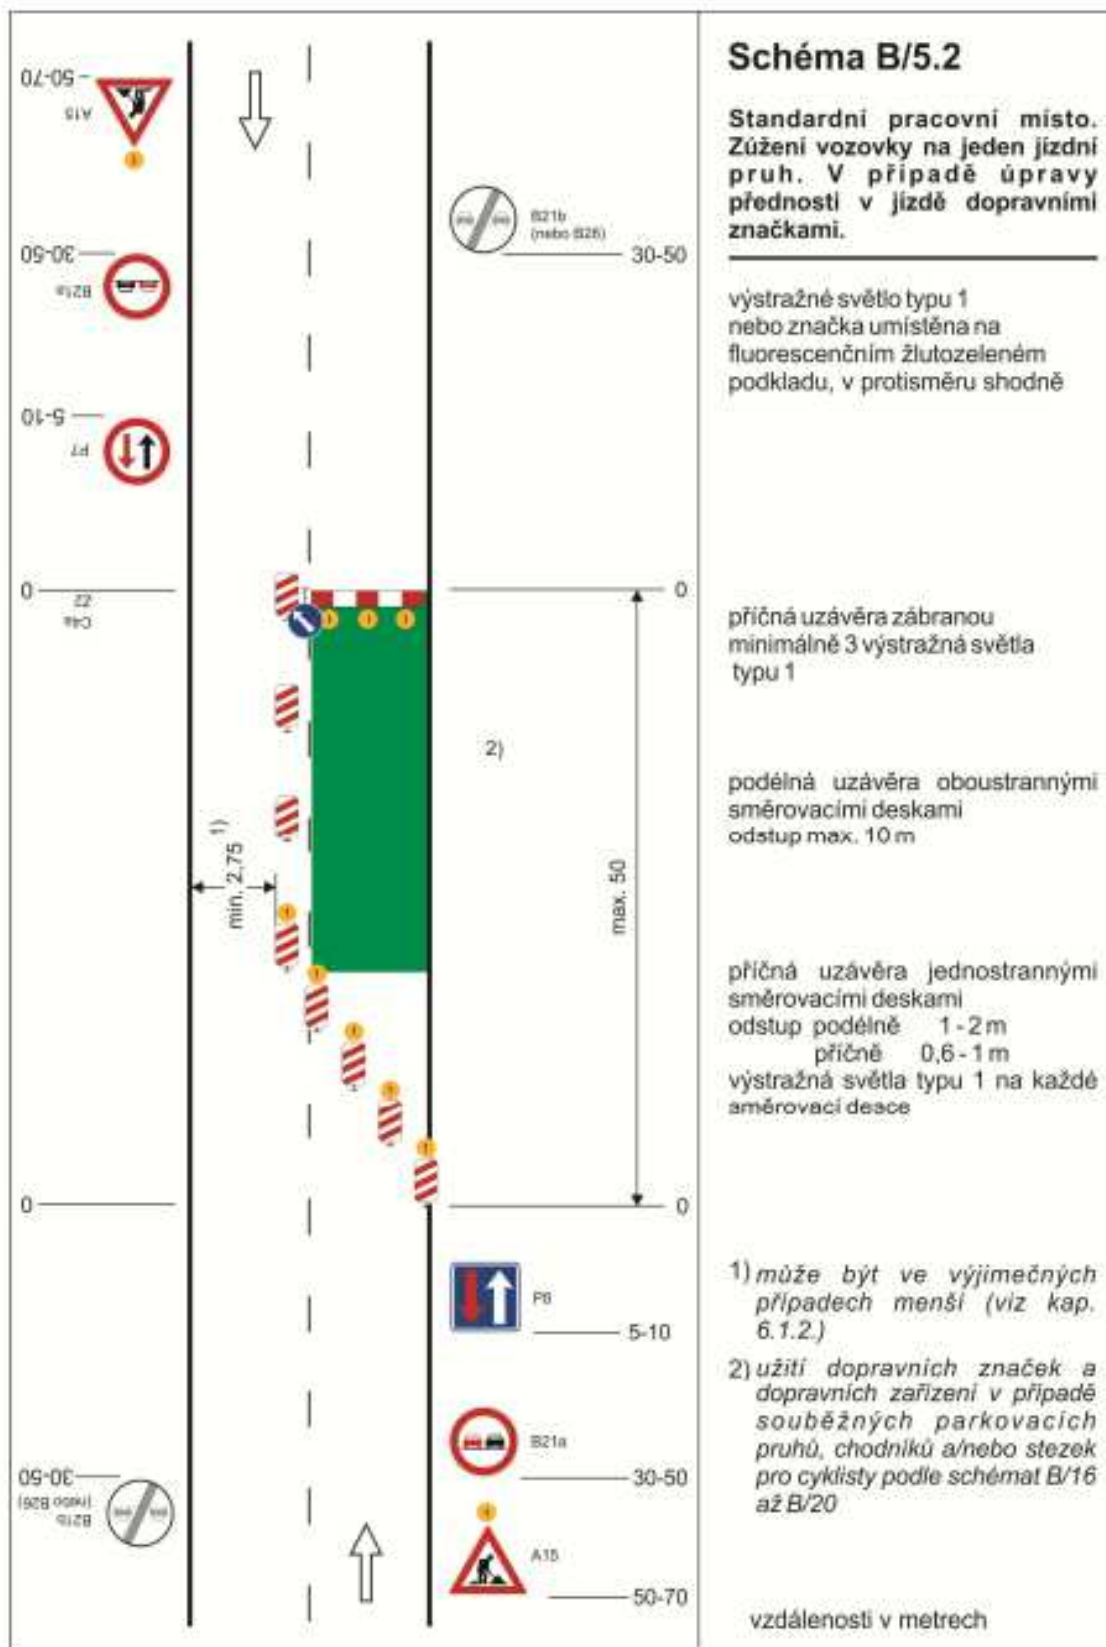

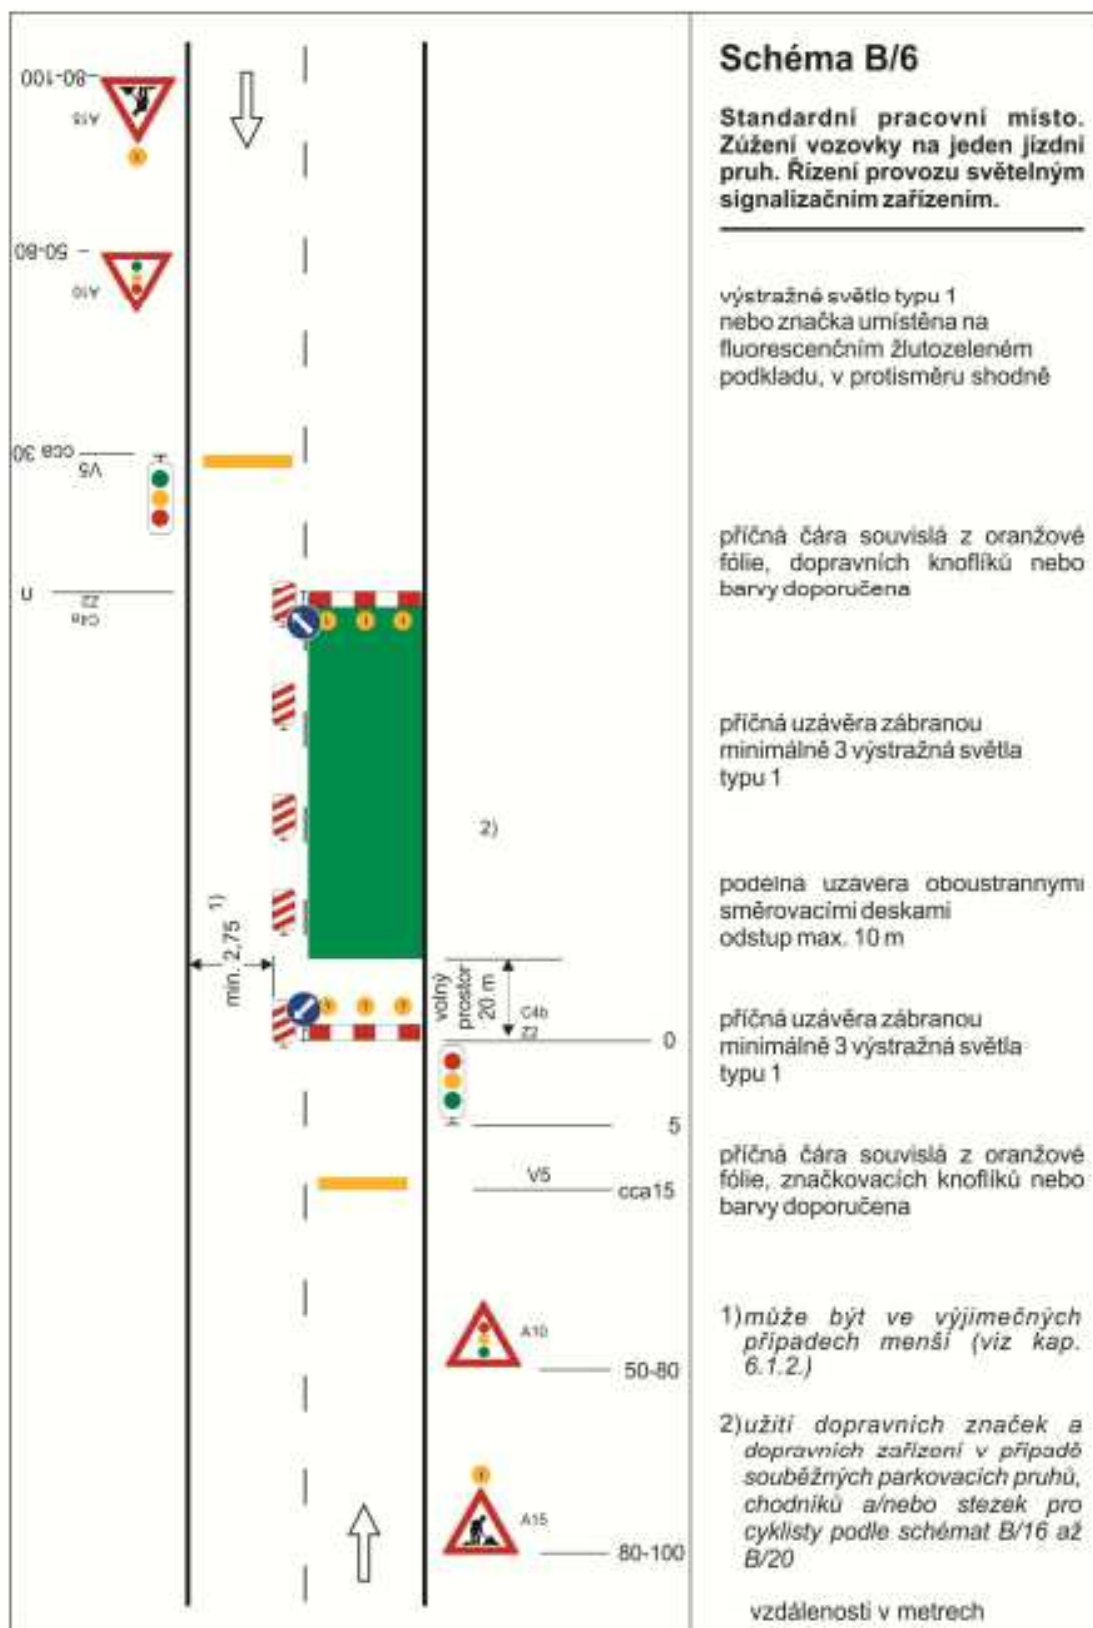

F.1.C. VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

V území dotčeném stavbou se nacházejí podzemní a nadzemní inženýrské sítě následujících správců:

1. **Město Česká Třebová**, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová ve správě firmy **Eko Bi s.r.o.**, Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová (veřejné osvětlení)
2. **ČEZ Distribuce a.s.**, Guldenerova 19, 303 28 Plzeň (energetická zařízení)
3. **CETIN** Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (sítě elektronických komunikací)
4. **GasNet, s.r.o., zastoupená společností GridServices, s.r.o.**, Plynářská 499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice (sítě plynářských zařízení)
5. **Kabelová televize CZ, s.r.o.**, Praha 10, Ruská 8, 101 00, provozovna: Nádražní 115, 560 02 Česká Třebová (sítě elektronických komunikací)
6. **Vlastníci okolních nemovitostí** (domovní přípojky na stávající vodovod, kanalizaci, plynovod, telekomunikační a energetická zařízení).

Podzemní a nadzemní inženýrské sítě mají pro zajištění jejich provozuschopnosti stanovena **ochranná pásma (viz Průvodní a souhrnná zpráva a Doklady)**. V prostoru ochranného pásma je nutno dodržovat stavebně technická omezení pro provádění a provoz stavby, která jsou stanovena příslušnými zákony, vyhláškami včetně příslušných vyjádření doložených v dokladové části této dokumentace.

Před zahájením výkopových prací je nutno požádat správce jednotlivých sítí o vytýčení inženýrských sítí. Dále je nutno informovat příslušné veřejnoprávní instituce, správce silnic apod. Zhotovitel stavby ověří správnou polohu stávajících zařízení, která mohou mít vliv na další průběh stavby.

Před zahájením výkopových prací je nutno požádat příslušné organizace o přesné vytýčení přístrojovou technikou, v místě křížení provádět zemní práce a sondy ručně a obecně plnit stanovené podmínky k provádění - viz dokladová část projektu. V místech křížení se stávajícím podzemním zařízením a ve vzdálenosti menší než 3 m od kmenů stromů je zhotovitel povinen provádět výkop ručně.

Toto opatření se týká i vedení IS ve správě majitelů nemovitostí resp. pozemků.

Při stavebních pracích je nutno respektovat zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. O zahájení výkopových prací bude zhotovitel minimálně 3 týdny předem informovat instituci oprávněnou k provádění archeologického výzkumu, se kterou bude projednán případný archeologický výzkum. Dojde-li při provádění zemních prací k archeologickým nálezům, budou veškeré práce okamžitě zastaveny a bude informováno příslušné archeologické pracoviště.

F.1.D. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ

Potřeba vody pro stavební práce bude řešena po dohodě se správcem vodovodu napojením na stávající vodovod.

Odvodnění (dešťová a podzemní voda) staveniště bude řešeno odtokem do vodoteče.

Telefonické spojení pro potřeby zhotovitele stavby si zajistí zhotovitel stavby (mobilními telefony).

F.1.E. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Projekt stavby respektuje platné ČSN a bezpečnostní předpisy jak pro výstavbu, tak i pro provoz zařízení.

Při provádění stavby je nutno dodržet příslušné ČSN, bezpečnostní a hygienické předpisy a předpisy o ochraně pracujících ve stavebnictví, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 ze dne 15. 04. 1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce v aktuálním znění a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na staveniště vyplývají mj. z nařízení vlády č.591/2006 Sb.:

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením.

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje.

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis.

7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.

Přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace bude nepřípustné.

F.1.F. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ

Při provádění stavby budou respektovány podmínky všech dotčených orgánů a organizací, viz dokladová část PD.

Při stavebních pracích bude respektován stávající stav jednotlivých dotčených pozemků. Při stavbě bude nutno dodržovat technologickou a pracovní kázeň a postupovat tak, aby nebyly dotčeny veřejné zájmy.

Před začátkem výstavby inženýrských sítí, včetně objížděk a dopravních uzávěrek bude oznámena jako dopravní omezení ve veřejných sdělovacích prostředcích, zajistí zhotovitel stavby. Soukromí vlastníci stavbou dotčených pozemků budou před zahájením prací informováni o průběhu výstavby, aby bylo možno zajistit výjezd jejich vozidel apod.

F.1.G. ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá vybudování centrálního zařízení staveniště. Pro pracovníky budou použity mobilní buňky, které budou umístěny na pozemku investora výstavby. Umístění bude dohodnuto mezi investorem a zhotovitelem při předání staveniště. Součástí výkresové části projektové dokumentace je situace se zákresem hranic staveniště a staveb zařízení staveniště s vyznačením vjezdů a výjezdů na staveniště.

S trvalými deponiemi není uvažováno. Mezideponie bude řešena podél stavěných úseků vodovodu na pozemcích, které budou určeny v dalším stupni projektové dokumentace. Přebytečný výkopek bude ukládán na řízenou skládku.

F.1.H. POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ

Nepředpokládá se výstavba staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení. Stavby zařízení staveniště jsou v kompetenci zodpovědnosti dodavatele stavby.

F.1.1. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při provádění stavby je nutno dodržovat podmínky zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Dle § 15 zákona č.309/2006 Sb.:

V případech, kdy při realizaci stavby:

- a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo
- b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umístované na staveništi nebo stavbě.

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 zákona, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Dále je nutno z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat:

- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce;
- nařízení vlády č. 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Zhotovitel stavby zajistí, aby všichni zaměstnanci i zaměstnanci subdodavatelů splňovali požadavky jakýchkoliv předpisů, které se týkají ochrany zdraví a bezpečnosti a které jsou platné v ČR.

Minimálně 7 dní před zahájením stavby poskytne zhotovitel stavby správci stavby bezpečnostní program, který bude obsahovat souhrn bezpečnostních pravidel provozovatele pro práce ve stávajících zařízeních. Zhotovitel zajistí poučení zaměstnanců o zásadách bezpečnosti práce. Bezpečnostní program bude v souladu s předpisy pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti, které jsou platné v ČR.

Zhotovitel stavby dále oznámí správci stavby jméno určeného bezpečnostního technika stavby, jenž bude zajišťovat záležitosti ovlivňující bezpečnost všech osob na staveništi. Dále bude dohlížet na dodržování předpisů k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti platných v ČR.

Zhotovitel stavby zajistí veškerá nezbytná opatření pro bezpečnost prací. Staveniště nebude představovat nebezpečí pro veřejnost, bude řádně označeno schválenými značkami, oplocením, zábranami a osvětlením.

F.1.J. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ

Nepatrné negativní účinky stavby na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, ořesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování podzemních vod nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech, zejména limity v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (změna č. 229/2007 Sb.) a v zákoně č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

V průběhu stavebních prací bude postupováno dle zákona č.114/1992 Sb. zákon o ochraně přírody a krajiny. Zhotovitel stavby zavede nezbytná opatření pro zajištění minimalizace znečištění v prostoru staveniště, přilehlých komunikací, přepravních tras a okolního životního prostředí. Při nákupu materiálů bude zhotovitel stavby brát v úvahu také jejich vliv na životní prostředí.

Zhotovitel stavby je povinen jednat při stavebních pracích ve smyslu zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) a je povinen nakládat s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady budou ukládány na řízenou skládku podle jejich kategorie a zhotovitel stavby bude vést jejich evidenci.

Podrobnější údaje viz Souhrnná technická zpráva.

F.1.J.1. OCHRANA PROTI HLUKU, VIBRACÍM A EMISÍM

Zhotovitel stavby musí při jejím provádění dbát mj. na:

- dodržování hygienických předpisů o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
- zajištění řádného technického stavu pracovních strojů, které budou opatřené předepsanými kryty proti hluku, v době nutných přestávek budou motory strojů zastaveny;
- průběžné technické prohlídky stavebních strojů;
- omezení prašnosti při stavebních pracích (nasycení vodou prašných míst, snížení rychlosti apod.);
- zajištění čištění pneumatik dopravních prostředků;
- zakrytí skládek sypkých materiálů vhodnými plachtami;
- udržování pořádku na staveništi a komunikacích.

Hluk ze stavební činnosti nebude překračovat hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb. Budou dodrženy požadavky vyplývající z § 30 ods. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a z § 12 odst. 9 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Provádění musí být zajištěno tak, aby odolávalo škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné prostředí v okolí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů je nutné dodržet následující podmínky: Při realizaci stavby nesmí být překročen hygienický limit hluku (ze stavební činnosti) pro venkovní chráněný prostor a venkovní chráněný prostor staveb:

- pro dobu od 7 do 21 hodin LAeq, 14 hod = 65 dB
- pro dobu od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin LAeq, 1 hod = 60 dB
- pro dobu od 22 do 6 hodn LAeq, 8 hod = 45 dB

a v chráněných vnitřních prostorách po dobu užívání v pracovních dnech:

- pro dobu od 7 do 21 hodin LAeq, 14 hod = 55 dB

Hlukové působení stavby

Stavební činností dojde v okolí stavby k lokálnímu a krátkodobému zvýšení hlukové zátěže.

Zdroji hluku budou jednak stavební stroje provádějící stavbu, jednak nákladní automobily, které budou ze staveniště odvážet odtěženou zeminu a odfrézovaný kryt vozovky a přivážet na staveniště stavební materiál.

Četnost jízdy nákladních vozidel se předpokládá maximálně 4 vozidla za hodinu (8 jízd). Toto množství, vzhledem k intenzitám provozu automobilů, nezvýší hlukovou zátěž podél komunikací, které budou součástí odjezdové a příjezdové trasy.

V současném stupni projektové dokumentace nejsou známy ani stavební stroje, které budou použity při rekonstrukci, ani dodavatel samotné stavby. Podrobně bude nutno vyřešit problematiku hlukového působení stavby na okolí v dalších stupních realizační projektové dokumentace (RPS). Hlukové zatížení přímo závisí na hlukové emisi stavebních strojů, přičemž se předběžně předpokládá užití strojů uvedených v následujícím přehledu. Podklady o hlučnosti použitých stavebních mechanismů byly převzaty z obvyklých hodnot jednotlivých druhů stavebních strojů.

Plné vytížení stavebních mechanismů není v celé době trvání jejich využití, ani v celé době trvání pracovní směny. Plné vytížení je přerušováno pracovními přestávkami, kontrolou strojů, přesouváním mechanismu atd. Obvyklá doba plného vytížení je něco mezi 50 až 60 % uvažovaného nasazeného stroje nebo pracovní doby. V případě 14. hodinového využití jde o 7 až 8 hodin plného běhu (s plným výkonem), u některých zařízení s délkou pracovní směny 10 hodin, jde jen o 6 až 7 hodin běhu s plným výkonem (tedy nejhluchnější provoz).

zařízení	LA dB/x m
hydraulické kladivo	98/1
rypadlo	90/1
dozer	90/1
autodomíchač	85/1
čerpadlo na beton	89/1
nákladní vozidlo	92/1

Ochranu a snížení možných hlukových dopadů výstavby na okolí je třeba řešit především prvky organizace výstavby a druhotně pak případnými dalšími opatřeními clonícího charakteru.

V případě problematiky hlukového působení a dosahování vyšších hodnot hlukového zatížení jde v první řadě o omezení doby činnosti hlučných zařízení a strojů na dobu, která v celkovém součtu a přepočtu na celodenní vlivy nepřekročí povolené hodnoty hluku z výstavby u nejbližších chráněných objektů.

F.1.J.2. OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD

Zhotovitel stavby musí dbát na to, aby při stavební činnosti nedošlo ke znečišťování podzemních a povrchových vod. Dešťové a podzemní vody nesmí být kontaminovány ropnými látkami, blátem apod. Zhotovitel stavby zajistí odvod dešťových vod mimo staveniště a zpracuje plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod.

F.1.J.3. NEBEZPEČNÉ LÁTKY

Pro dovoz a používání nebezpečných látek musí zhotovitel v předstihu zajistit písemné povolení správce stavby a potřebná oprávnění k manipulaci s těmito látkami. Písemné schválení správce stavby je třeba pro polohu každého skladu a zásobárny nebezpečných látek na stavbě. Zhotovitel stavby zabezpečí při nakládání s nebezpečnými látkami veškeré povinnosti v souladu s platnými právními předpisy, především se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů.

F.1.K. ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH TERMÍNŮ

Postup provádění stavby a jednotlivé etapy stavby budou dohodnuty mezi investorem a zhotovitelem.

Termín zahájení se předpokládá v letech 10/2025 – 12/2025.

Vzhledem ke vzájemným vazbám jednotlivých objektů nepředpokládá se rozdělení stavby do etap, které by byly časově odděleny na více jak 3 měsíce.

Postup provádění stavby bude dohodnut mezi investorem a zhotovitelem. Lhůty výstavby ovlivňuje vzájemná návaznost jednotlivých etap.

Uvedení stavby do provozu bude předcházet řádné přijímací řízení od stavebního dodavatele včetně předání stavebního deníku a protokolu o zkouškách vodotěsnosti dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.

Následně bude provedeno přijímací řízení mezi zhotovitelem a investorem stavby.

Po ukončení přijímacího řízení bude požádán místně příslušný pověřený speciální stavební úřad o kolaudační souhlas.

V Ústí nad Orlicí
březen 2021

Vypracoval:

Bohumil Štěpánek, DiS.

Odpovědný projektant:

Ing. Miloš Popelář.
